

การประชุม Kickoff โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (คพล.)

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม อบต. บ้านกาศ

กำหนดการประชุม




การประชุม Kickoff งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่าย ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (คพล.) บริษัท กันกุล เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

- ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2 แนะนำโครงสร้างสำนักงาน และทีมงานที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบวาระที่ 3 รายละเอียดโครงการ
- ระเบียบวาระที่ 4 เงื่อนไขสัญญา และการจ่ายเงิน
- ระเบียบวาระที่ 5 ข้อแนะนำสำหรับผู้รับจ้าง ในการเริ่มต้นดำเนินการ
- ระเบียบวาระที่ 6 สรุปความเห็นของที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2: แนะนำโครงสร้างสำนักงาน และทีมงานที่เกี่ยวข้อง



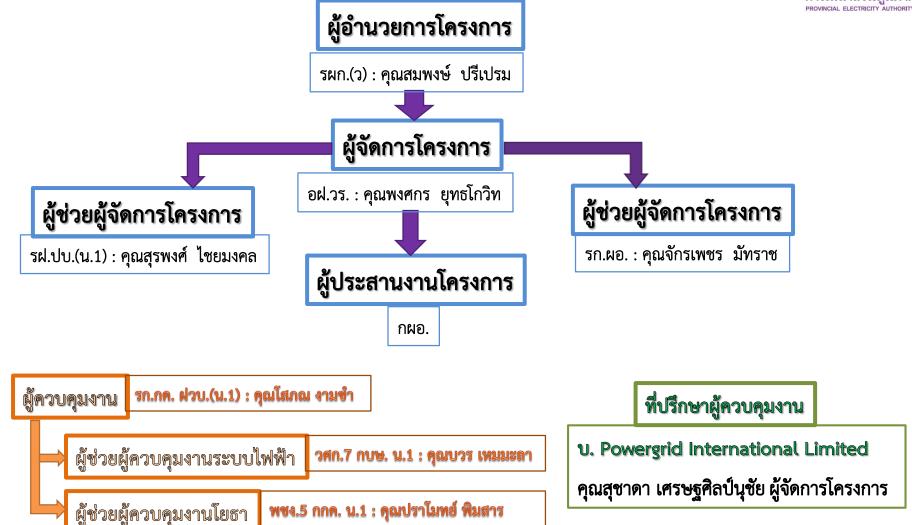

ระเบียบวาระที่ 2: แนะนำทีมงานที่เกี่ยวข้อง



ทีมที่ปรึกษาควบคุมงานฯ บริษัท PowerGrid International Limited จำนวน 13 ท่าน

| 1 | คุณสุชาดา | เศรษฐศิลป์นุจ | ชัย ผู้จัดการโครงการ |
|---|---------------|----------------|-----------------------------|
| 2 | คุณชยพัทธ์ | พงษ์เพชร | ที่ปรึกษาโครงการ |
| 3 | คุณสราวุธ | ปรีชาไว | ผู้ควบคุมงานด้านระบบ |
| 4 | คุณวีระ | วุฒิเกษมกิจ | ผู้ควบคุมงานด้านโยธา |
| 5 | คุณศักดา | เชี่ยวนั้นทวงศ | ร์ สถาปนิก |
| 6 | คุณณรงค์ฤทธิ์ | สุโภภาค | ผู้ประสานงานโครงการ |
| 7 | คุณพรชนก | จันทน | เจ้าหน้าที่ประสานงาน/ธุรการ |

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

- 1 George Horvath
- 2 Dennis Preston
- 3 C Scott Thode
- 4 Darren van Druten
- 5 Rebecca Shaw
- 6 Marc Amando Marquez
- 7 Matt Shanks

ระเบียบวาระที่ 2: แนะนำคณะกรรมการตรวจรับ




คณะกรรมการตรวจรับ งานจ้างโครงการ คพล.

| คุณสุรพงศ์ | ไชยมงคล | รฝ.ปบ. ฝปบ.(น.1) | ประธานกรรมการ |
|-------------|-----------|------------------|---------------|
| คุณวราวุธ | จิตตพันธ์ | รก.บษ. ฝปบ.(น.1) | กรรมการ |
| คุณจักรเพชร | มัทราช | รก.ผอ. ฝวร. | กรรมการ |

คณะกรรมการตรวจรับ งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการ คพล.


| คุณบรรพต | ตั้งเจริญดี | รก.วร. ฝวร. | ประธานกรรมการ |
|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| คุณชิษณุพงศ์ | สัจจะวัฒนวิมล | รก.คก. ฝวร. | กรรมการ |
| คุณพันรบ | ชินบุตร | ชก.อค. ฝคฟ. | กรรมการ |
| คุณวัฒณิช | อ่อนหยับ | วศก.9 ศสฟ. ฝคฟ. | กรรมการ |
| คุณวาริช | ขุนอักษร | วศก.9 กผอ. ฝวร. | กรรมการ |



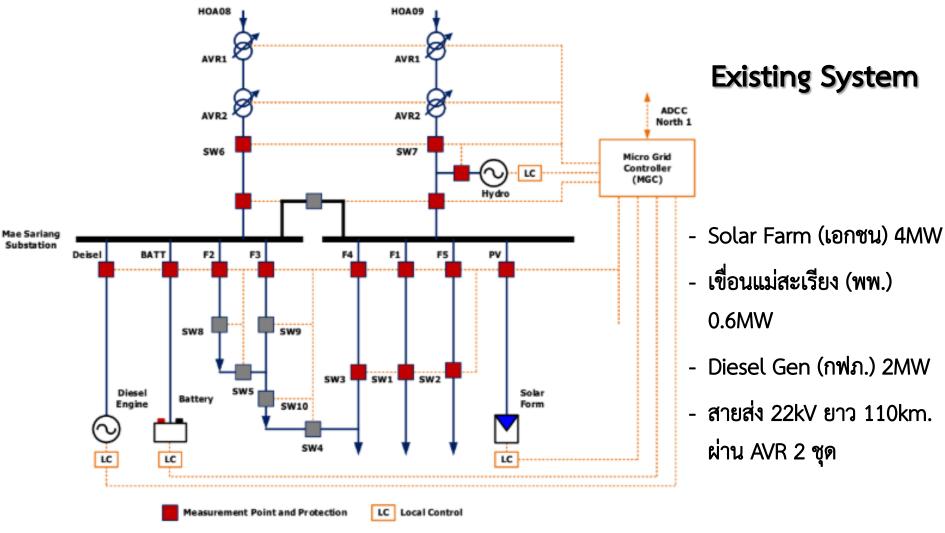



Scope of work

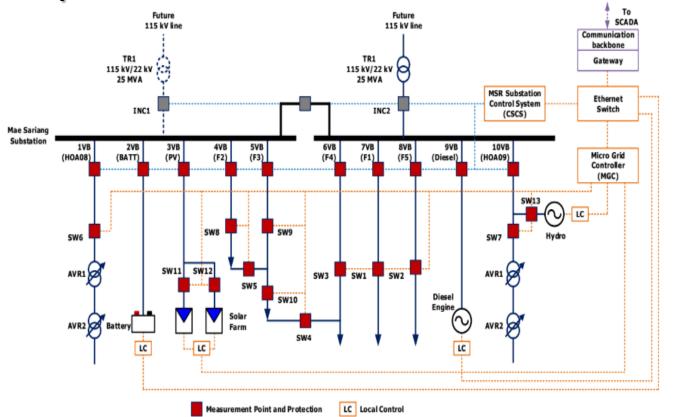

- Microgrid Controller
- Energy Storage (Li-ion)3MW/1.5MWh
- Communication
- Diesel Generator
- RCS
- Data Interface
- Cyber Security
- Control Building
- Smart Device


วงเงิน :

132.9 ล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินการ :

360 วัน



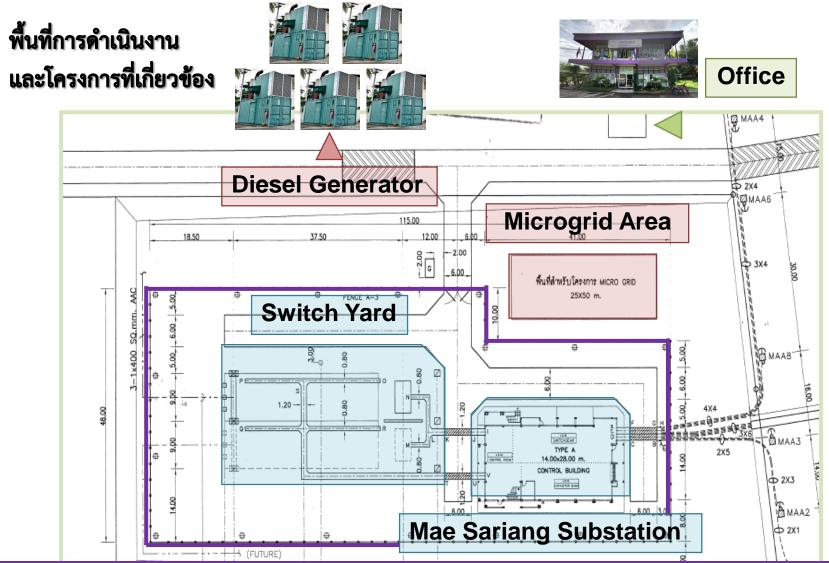



สภาพพื้นที่ปัจจุบัน





เงื่อนไขสัญญา

ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ <u>360 วัน</u> นับถัดจากวันลงนามในสัญญา<mark>และ</mark>ส่งมอบพื้นที่

ลงนามสัญญา : 7 กันยายน 2561

ส่งมอบพื้นที่ : 12 กันยายน 2561

ขอบเขตงาน งานระบบ ระบบควบคุมไมโครกริด ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ งานโยธา ระบบสื่อสาร Fiber Optic ก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมระบบไมโครกริด, ปรับปรุงระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล สวิตซ์ตัดต่อวงจร ระบบควบคุมอาคาร Smart Devices การเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบควบคุมและระบบป้องกัน for a Building Energy เดิมภายในสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง **Management System (BEMS)** ระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์



เงื่อนไขสัญญา

ผู้รับจ้างต้องดำเนินงาน ดังนี้



1

ก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมไมโครกริด (Microgrid Control Center), ตู้คอนเทน เนอร์แบตเตอรี่, หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า และระบบอื่นๆ บนพื้นที่ประมาณ 25 x 50 ม.



เงื่อนไขสัญญา

- a่งมอบระบบไมโครกริด ที่ทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ และงานจะถือว่าเสร็จสิ้นไม่ได้ หากการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่ได้ออกหนังสือรับรองผลงาน (Provisional Acceptance Certificate: PAC)
- 3 ต้องทำแผนการทำงาน (Work Schedule) และแผนเบิกจ่ายเงิน
- 4 ต้องจัดทำรายงาน Monthly Progress Report จัดส่งให้ สนง. คพล. จนกระทั่งการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาครับมอบงานงวดสุดท้าย
 - ต้องออกแบบและติดตั้งระบบไมโครกริด เพื่อรองรับการจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งจาก ระบบสายส่ง 115 เควีและ/หรือระบบจำหน่าย 22 เควี ทั้งนี้ ในกรณีระบบสายส่ง 115 เควียังไม่พร้อม ใช้งานในวันทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการปรับเปลี่ยนการจ่ายไฟจาก ระบบจำหน่าย 22 เควีเป็นระบบสายส่ง 115 เควี



เงื่อนไขสัญญา

ต้องจัดทำแผนงานติดตั้ง และแผนงานทดสอบ (Test Plan) พร้อมขั้นตอนการดำเนินการ ติดตั้งและทดสอบของอุปกรณ์ทั้งหมด ทั้งการทดสอบ ณ ที่ผลิต Factory Acceptance Test (FAT), Factory Routine Test (FRT) และการทดสอบที่หน้างาน (Site Acceptance Test : SAT) ให้การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเริ่มงานล่วงหน้าอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วัน

การติดตั้งและสับเปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอน

ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานแผนงานการรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน และจัดส่งให้การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใน 120 วัน และต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน

สำนักงานโครงการ (Site Office) และคลังพัสดุ

- (1) ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดให้มีสำนักงานสำหรับควบคุมงานของ กฟภ. ประจำ ณ สถานที่ก่อสร้าง
- (2) ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีคลังพัสดุสำหรับเก็บอุปกรณ์ ณ สถานที่ก่อสร้าง



เงื่อนไขสัญญา

9

Training

In-Plant Training

On-The-Job Training

Operator Training


การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (Non-Disclosure Agreement)

- (1) ลิขสิทธิ์ในเอกสารทุกฉบับซึ่งผู้รับจ้าง ได้ทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญาในโครงการนี้ ให้ตกเป็นของผู้ว่าจ้าง ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่เกิดขึ้นจากงานตามสัญญานี้ หากคู่สัญญาไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตก เป็นของผู้ว่าจ้างด้วย
- (2) ผู้รับจ้างต้องรักษาความลับของข้อมูลและสถิติต่างๆ ซึ่งผู้ว่าจ้างได้ให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อใช้ในการ ทำงานตามสัญญานี้เท่านั้น



รับประกันผลงาน 3 ปี



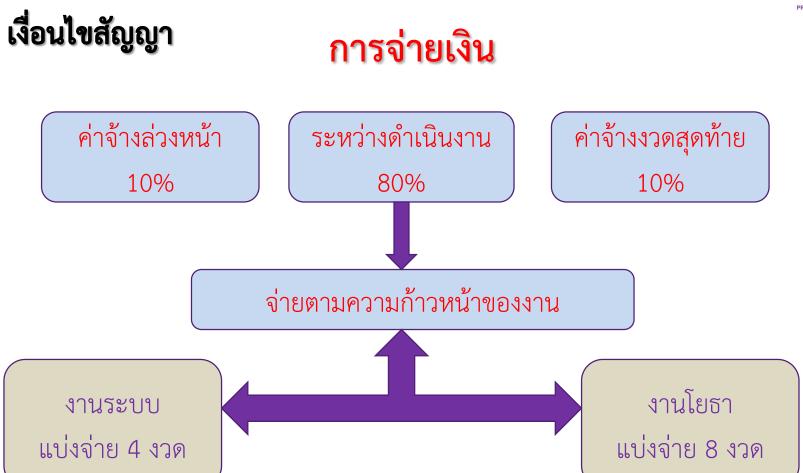



การจ่ายเงินค่าจ้าง

การจ่ายเงินค่าจ้างระหว่างดำเนินงาน (80%)

ค่างวดงานจ้างเหมาด้านระบบ (4 งวด)

<u>งวดที่ 1</u> (10%)

- จัดทำ Power System Study
- จัด In-Plant Training

<u>งวดที่ 2</u> (20%)

- จัด FAT ณ โรงงานผู้ผลิต (อุปกรณ์หลัก)

<u>งวดที่ 3</u> (30%)

- ร่วมรื้อถอนอุปกรณ์
- ติดตั้งอุปกรณ์ครบถ้วน พร้อมจัด SAT และส่งผลการทดสอบ Pre-test

<u>งวดที่ 4</u> (20%)

- จัด SAT
- จัด On-The-Job Training



การจ่ายเงินค่าจ้าง

การจ่ายเงินค่าจ้างระหว่างดำเนินงาน (80%)

ค่างวดงานโยธา (8 งวด; งวดละ 10%; ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน)

<u>งวดที่ 1</u> (10%)

- ร้อยละ 25 ของปริมาณงานด้านโยธา ภายใน 60 วัน

งวดที่ 2 (10%)

- ร้อยละ 37.5 ของปริมาณงานด้านโยธา ภายใน 120 วัน - ร้อยละ 77.5 ของปริมาณงานด้านโยธา ภายใน 240 วัน

งวดที่ 3 (10%)

- ร้อยละ 47.5 ของปริมาณงานด้านโยธา ภายใน 150 วัน - ร้อยละ 87.5 ของปริมาณงานด้านโยธา ภายใน 270 วัน

<u>งวดที่ 4</u> (10%)

- ร้อยละ 57.5 ของปริมาณงานด้านโยธา ภายใน 180 วัน - ร้อยละ 100 ของปริมาณงานด้านโยธา ภายใน 300 วัน

งวดที่ 5 (10%)

- ร้อยละ 67.5 ของปริมาณงานด้านโยธา ภายใน 210 วัน

งวดที่ 6 (10%)

งวดที่ 7 (10%)

งวดที่ 8 (10%)



การจ่ายเงินค่าจ้าง

Last Payment (10%)

- จัดฝึกอบรม Operator Training
- กฟภ. ได้ทำการตรวจรับงานทั้งหมด
- ผู้รับจ้างจัดส่ง As Build Drawing
- กฟภ. ออกหนังสือรับรองผลงาน (PAC)

ระเบียบวาระที่ 5: ข้อแนะนำสำหรับผู้รับจ้าง ในการเริ่มต้นดำเนินการ



งานฐานรากต่างๆ หากจำเป็นต้องลงเสาเข็ม ควรต้องเร่งดำเนินการภายในสิ้นเดือน กันยายน เนื่องจากข้อจำกัดของการนำเข้าอุปกรณ์งานสถานีไฟฟ้า

การเชื่อมต่อระบบกราวด์ของงานส่วนไมโครกริดกับงานส่วนสถานีไฟฟ้า ควรติดตั้ง Test Plug

ต้องจัดหาสถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ปะปนกับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

ระเบียบวาระที่ 6: สรุปความเห็นของที่ประชุม



YouWall.com

